Sanbornton 2011
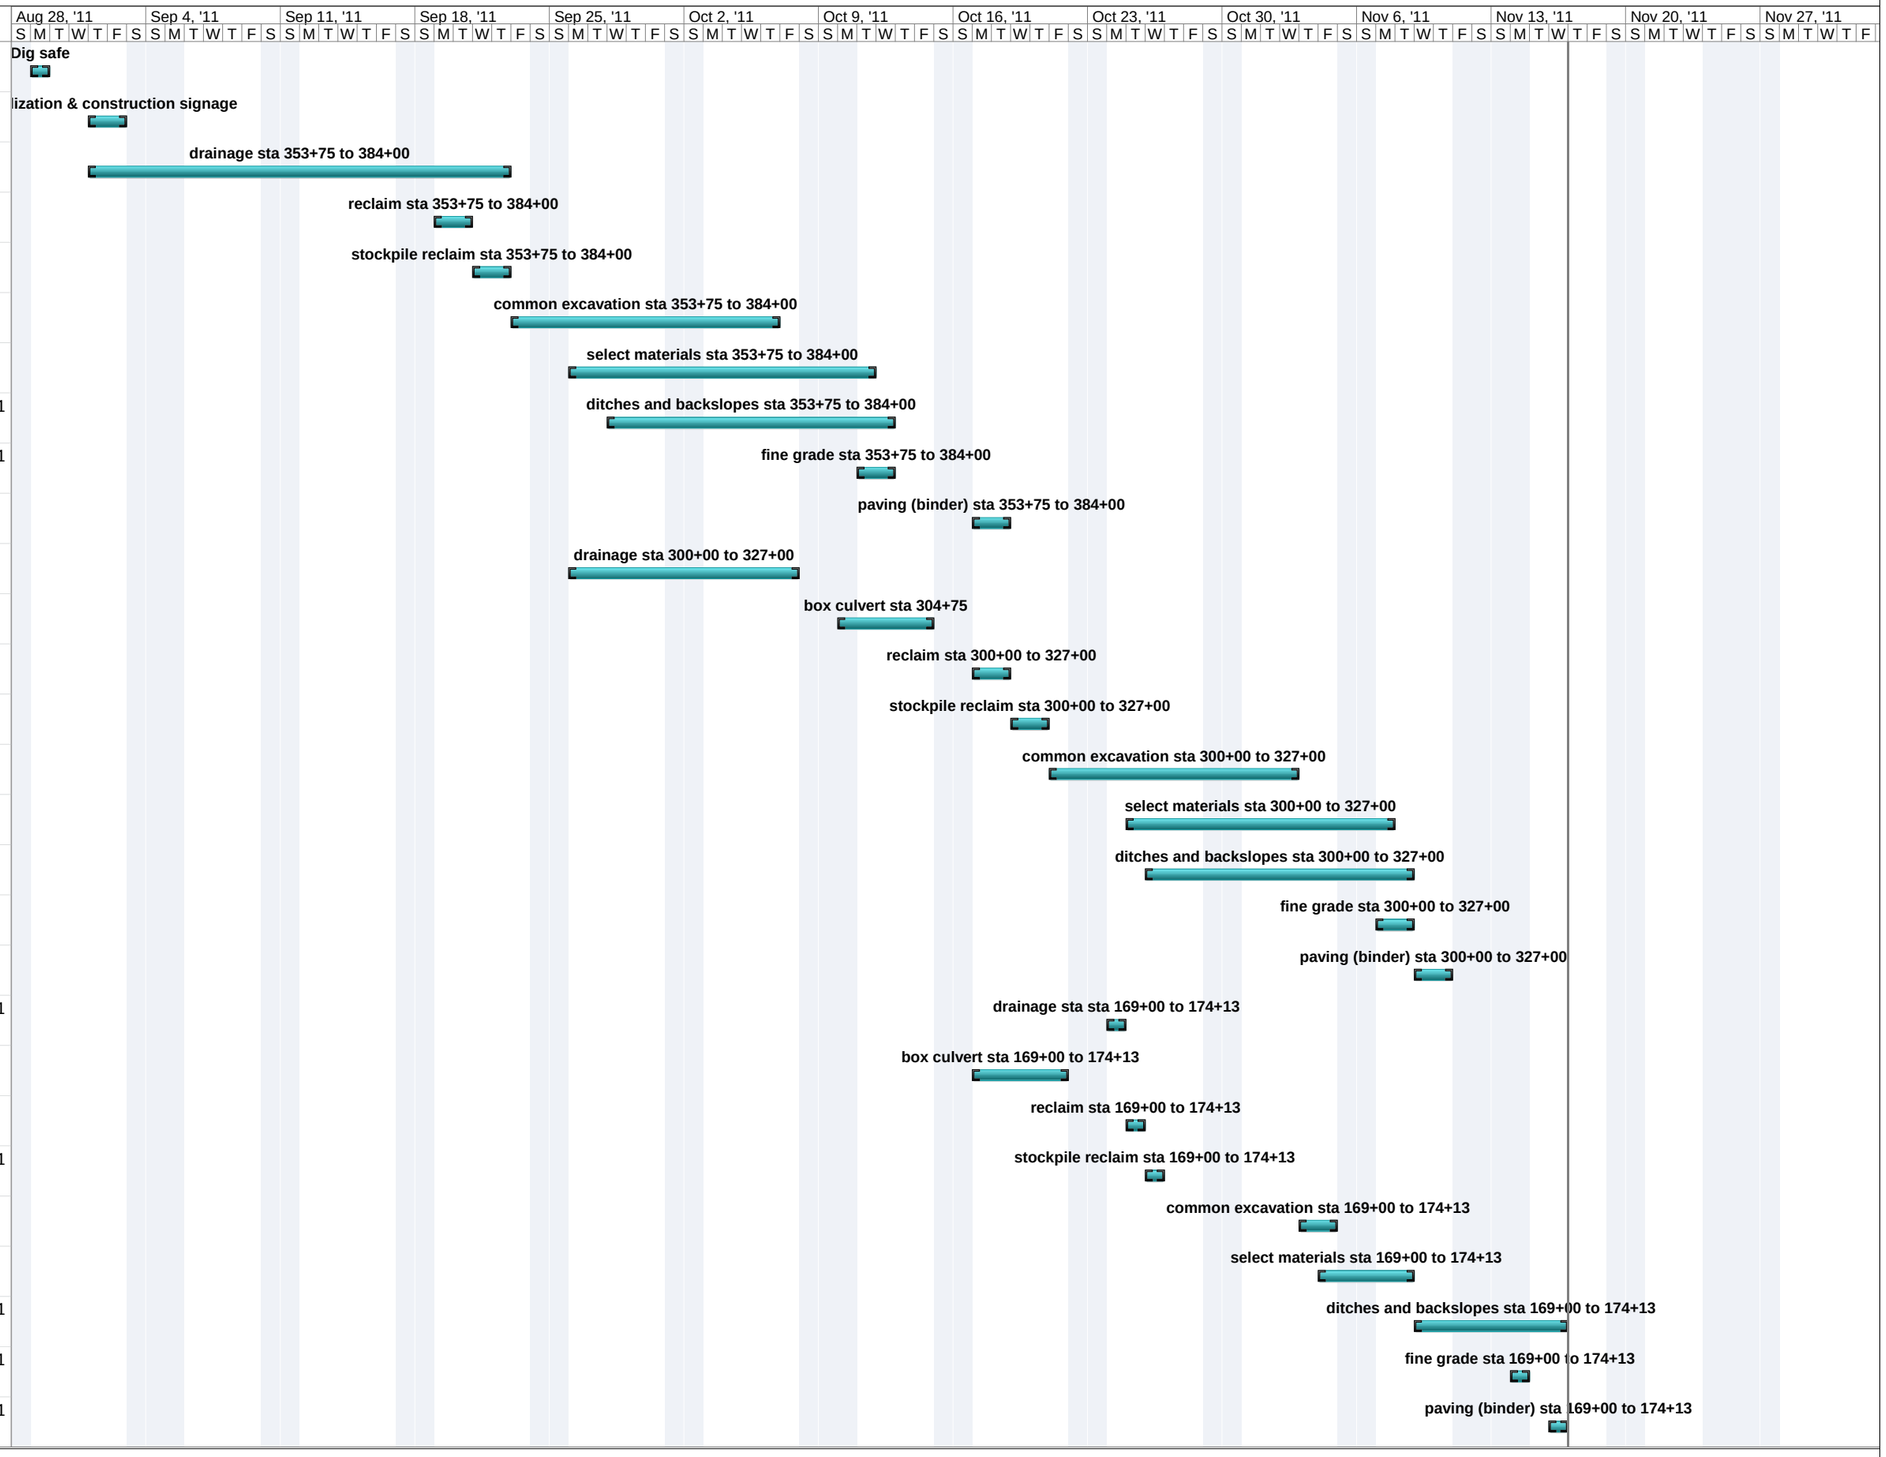
Task Name	Duration	Start	Finish
Dig safe	1 day	Mon 8/29/11	Mon 8/29/11
moblization & construction signage	2 days	Thu 9/1/11	Fri 9/2/11
drainage sta 353+75 to 384+00	15 days	Thu 9/1/11	Thu 9/22/11
reclaim sta 353+75 to 384+00	2 days	Mon 9/19/11	Tue 9/20/11
stockpile reclaim sta 353+75 to 384+00	2 days	Wed 9/21/11	Thu 9/22/11
common excavation sta 353+75 to 384+00	10 days	Fri 9/23/11	Thu 10/6/11
select materials sta 353+75 to 384+00	11 days	Mon 9/26/11	Tue 10/11/11
ditches and backslopes sta 353+75 to 384+00	10 days	Wed 9/28/11	Wed 10/12/11
fine grade sta 353+75 to 384+00	2 days	Tue 10/11/11	Wed 10/12/11
paving (binder) sta 353+75 to 384+00	2 days	Mon 10/17/11	Tue 10/18/11
drainage sta 300+00 to 327+00	10 days	Mon 9/26/11	Fri 10/7/11
box culvert sta 304+75	5 days	Mon 10/10/11	Fri 10/14/11
reclaim sta 300+00 to 327+00	2 days	Mon 10/17/11	Tue 10/18/11
stockpile reclaim sta 300+00 to 327+00	2 days	Wed 10/19/11	Thu 10/20/11
common excavation sta 300+00 to 327+00	9 days	Fri 10/21/11	Wed 11/2/11
select materials sta 300+00 to 327+00	10 days	Tue 10/25/11	Mon 11/7/11
ditches and backslopes sta 300+00 to 327+00	10 days	Wed 10/26/11	Tue 11/8/11
fine grade sta 300+00 to 327+00	2 days	Mon 11/7/11	Tue 11/8/11
paving (binder) sta 300+00 to 327+00	2 days	Wed 11/9/11	Thu 11/10/11
drainage sta sta 169+00 to 174+13	1 day	Mon 10/24/11	Mon 10/24/11
box culvert sta 169+00 to 174+13	5 days	Mon 10/17/11	Fri 10/21/11
reclaim sta 169+00 to 174+13	1 day	Tue 10/25/11	Tue 10/25/11
stockpile reclaim sta 169+00 to 174+13	1 day	Wed 10/26/11	Wed 10/26/11
common excavation sta 169+00 to 174+13	2 days	Thu 11/3/11	Fri 11/4/11
select materials sta 169+00 to 174+13	3 days	Fri 11/4/11	Tue 11/8/11
ditches and backslopes sta 169+00 to 174+13	4 days	Wed 11/9/11	Wed 11/16/11
fine grade sta 169+00 to 174+13	1 day	Mon 11/14/11	Mon 11/14/11
paving (binder) sta 169+00 to 174+13	1 day	Wed 11/16/11	Wed 11/16/11
