Sanbornton 2012
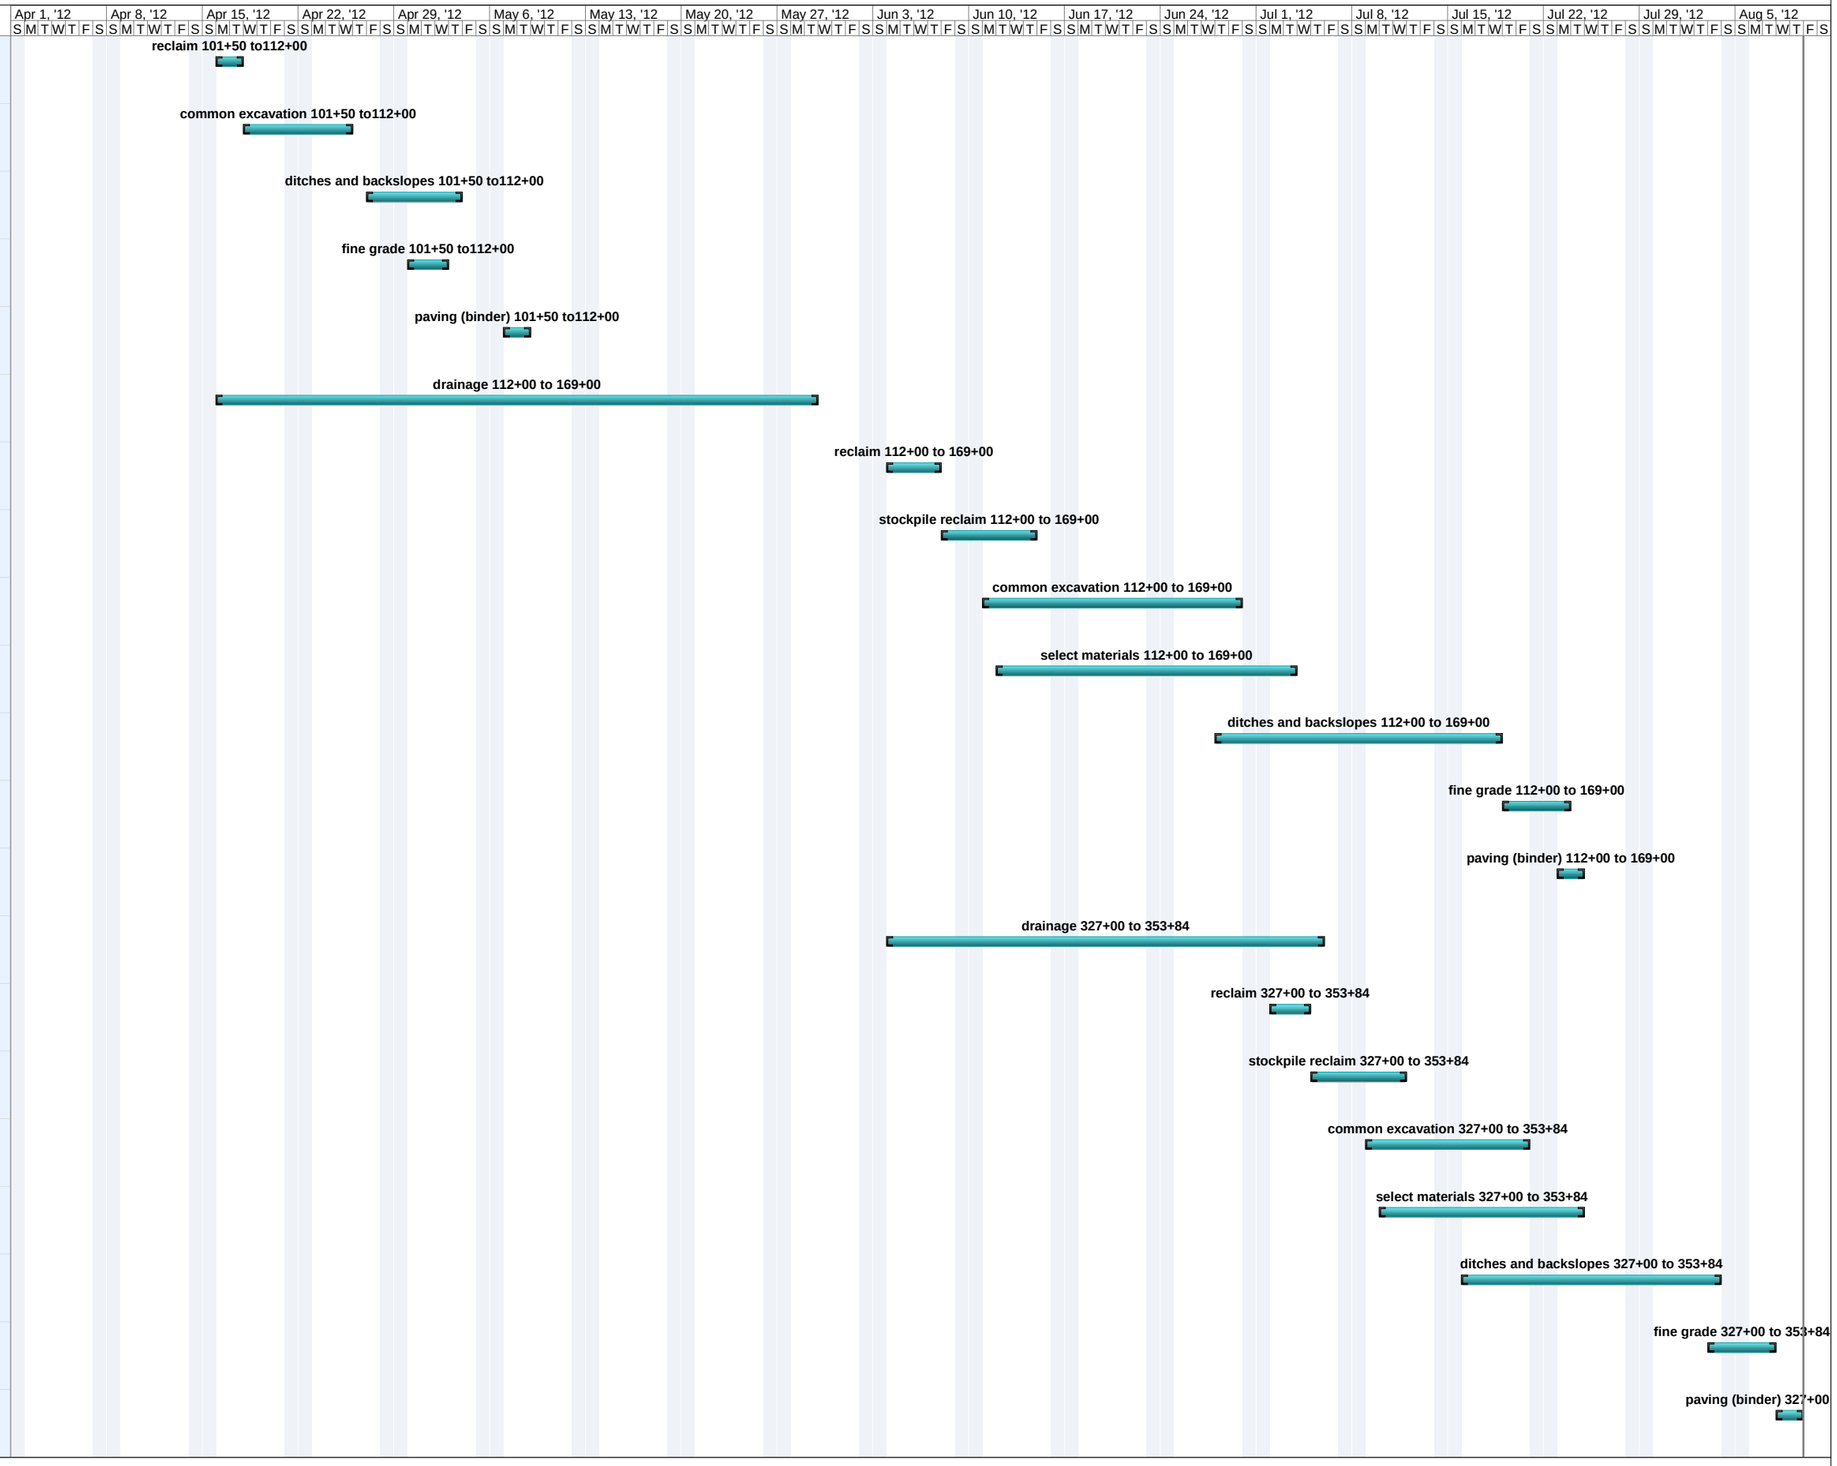
| Task Name | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| reclaim 101+50 to112+00 | 2 days | Mon 4/16/12 | Tue 4/17/12 |
| common excavation 101+50 to112+00 | 6 days | Wed 4/18/12 | Wed 4/25/12 |
| ditches and backslopes 101+50 to112+00 | 5 days | Fri 4/27/12 | Thu 5/3/12 |
| fine grade 101+50 to112+00 | 3 days | Mon 4/30/12 | Wed 5/2/12 |
| paving (binder) 101+50 to112+00 | 2 days | Mon 5/7/12 | Tue 5/8/12 |
| drainage 112+00 to 169+00 | 32 days | Mon 4/16/12 | Tue 5/29/12 |
| reclaim 112+00 to 169+00 | 4 days | Mon 6/4/12 | Thu 6/7/12 |
| stockpile reclaim 112+00 to 169+00 | 5 days | Fri 6/8/12 | Thu 6/14/12 |
| common excavation 112+00 to 169+00 | 15 days | Mon 6/11/12 | Fri 6/29/12 |
| select materials 112+00 to 169+00 | 16 days | Tue 6/12/12 | Tue 7/3/12 |
| ditches and backslopes 112+00 to 169+00 | 15 days | Thu 6/28/12 | Wed 7/18/12 |
| fine grade 112+00 to 169+00 | 3 days | Thu 7/19/12 | Mon 7/23/12 |
| paving (binder) 112+00 to 169+00 | 2 days | Mon 7/23/12 | Tue 7/24/12 |
| drainage 327+00 to 353+84 | 24 days | Mon 6/4/12 | Thu 7/5/12 |
| reclaim 327+00 to 353+84 | 3 days | Mon 7/2/12 | Wed 7/4/12 |
| stockpile reclaim 327+00 to 353+84 | 5 days | Thu 7/5/12 | Wed 7/11/12 |
| common excavation 327+00 to 353+84 | 10 days | Mon 7/9/12 | Fri 7/20/12 |
| select materials 327+00 to 353+84 | 11 days | Tue 7/10/12 | Tue 7/24/12 |
| ditches and backslopes 327+00 to 353+84 | 15 days | Mon 7/16/12 | Fri 8/3/12 |
| fine grade 327+00 to 353+84 | 3 days | Fri 8/3/12 | Tue 8/7/12 |
| paving (binder) 327+00 to 353+84 | 2 days | Wed 8/8/12 | Thu 8/9/12 |
